



Småkraftkonsesjonen er på plass – *når kan en begynne å bygge?*

NVE - miljøtilsyn sine erfaringar

Ole Per Schei

Senioringeniør, NVE

Miljøtilsyn vassdragsanlegg (TBMV)

Bergen, 2.april, 2025



Småkraftforeninga si bestilling av tema


- Småkraftkonsesjonen er på plass – når kan en begynne å bygge
- Nettilknytning, hva kreves
- Disp fra kommunens arealplan, (som regel) gjerne touche innom hvilke vilkår kommunen kan sette i slike tilfelle.
- Endringer som kan tas i detaljplan
- Dagens staltips



Jippi - vi fikk konsesjon til småkraftverk



Frå konsesjonsvedtak til byggestart – forenkla prosessbeskrivelse

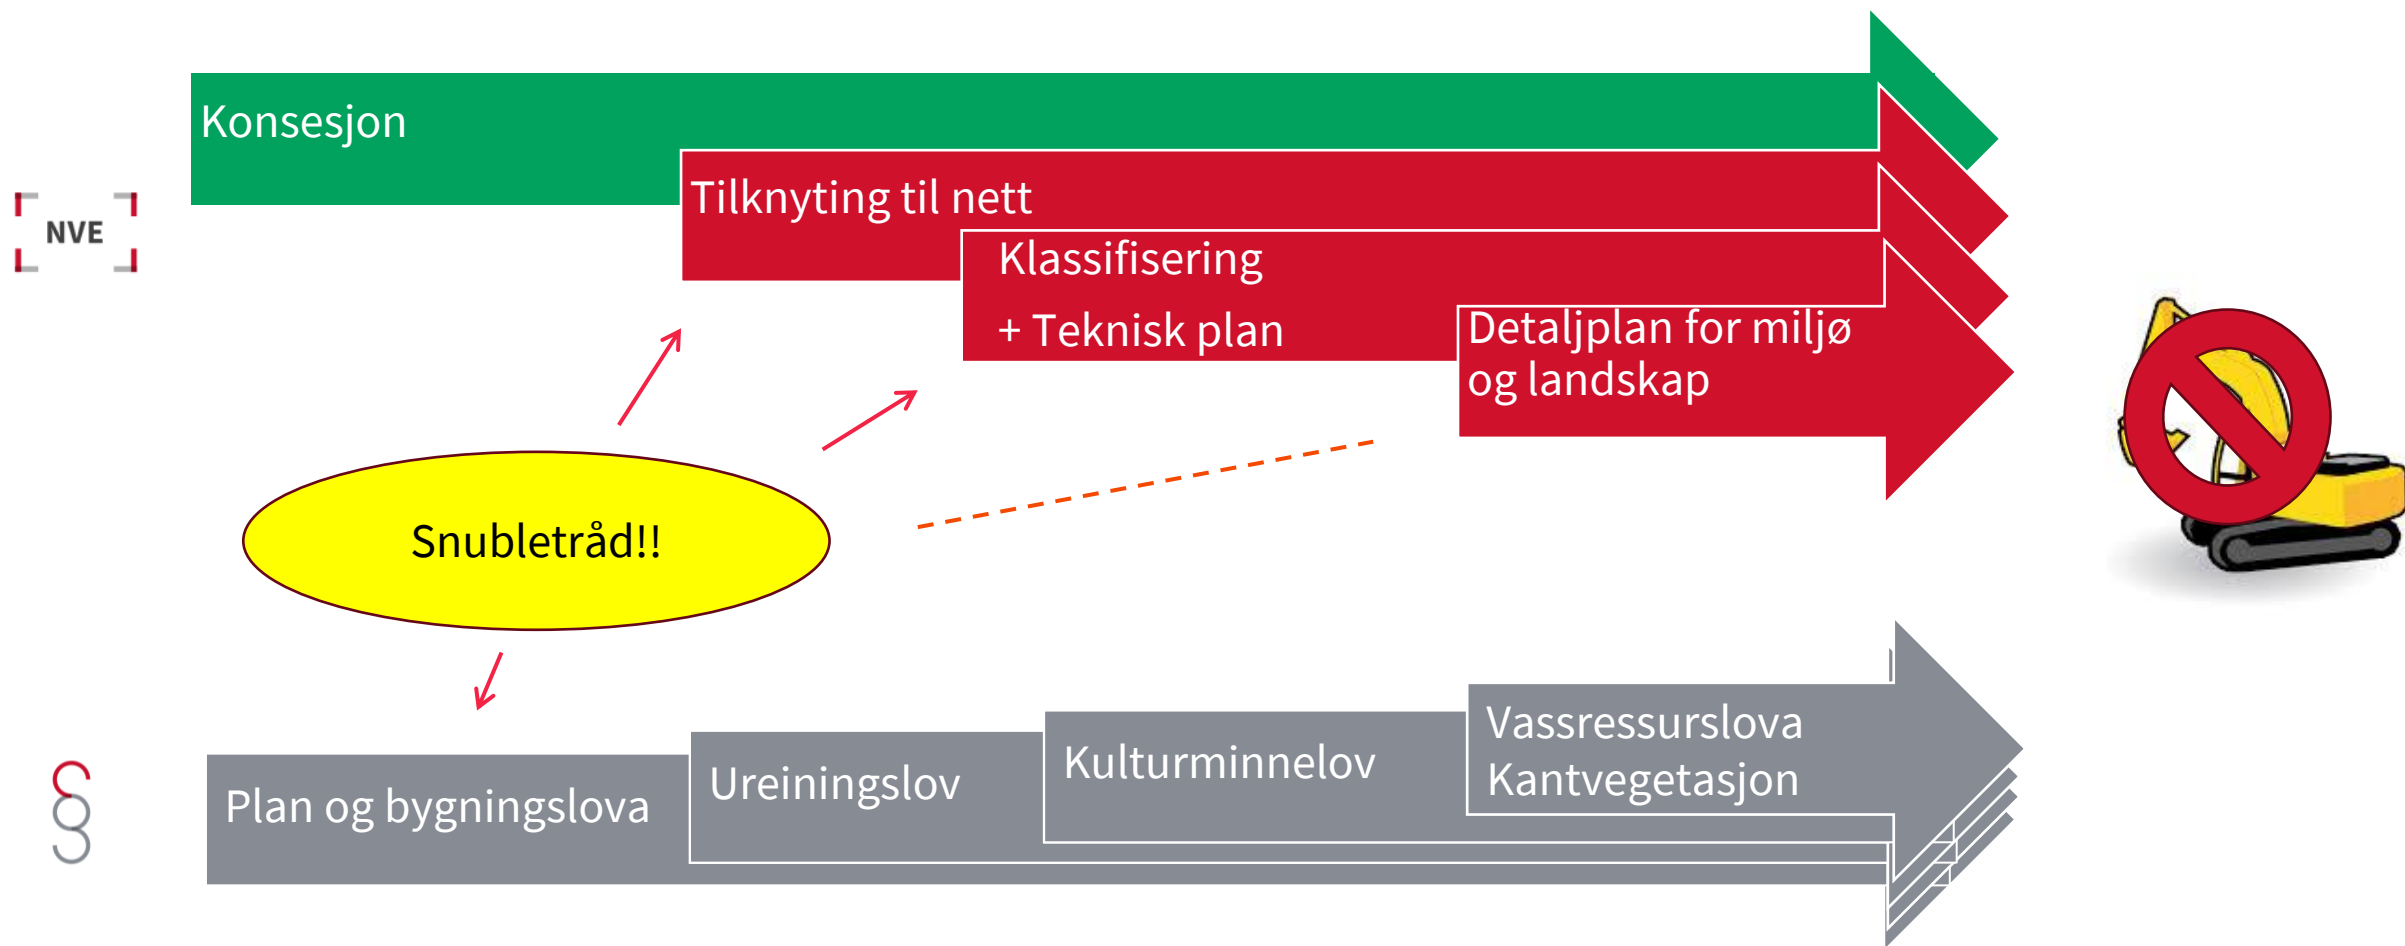

Tilknytning til nett

1. Via områdekonsesjonær sitt løyve
2. Anleggskonsesjon – NVE veileder
 - [Konsesjonssøknad nettanlegg: Praktisk informasjon](#)
- Sakshandsamingstid:
 - Mindre konsesjonssøknader med høyring: **6-12 mnd**
 - Enkle og godt forberedte søknader (hurtigsporet): normalt innen **3 mnd**
 - **Estimert etter at det er tildelt sakshandsamar**

Bruk rettleiar!!

Snubletråd 1

Konsesjonssøknad nettanlegg

Publisert 15.02.23

Sist endret 19.12.24



Q Søk i konsesjonssøknad nettanlegg

Praktisk informasjon →

Søknad om anleggskonsesjon ^

Innledning →

Beskrivelse av planlagte anlegg →

Behovet for å gjøre tiltak →

Samfunnsøkonomisk vurdering og tekniske forhold →

Virkninger for miljø og samfunn →

Naturfare og beredskap →

Forholdet til grunneiere og rettighetshavere →

Vedlegg til søknaden →



Klassifisering + Teknisk plan


- Klassifisering
- Krav om **teknisk plan: min 6 mnd før byggestart..**

Snubletråd 2

Detaljplan for miljø og landskap

- Siste ledd i NVE – prosessen
- Alt anna skal være på plass
- Sakshandsamingstid inntil **6 mnd**
 - Synfaring på barmark – utfordrar sakshandsamingstida
 - Høyring

Snubletråd 3

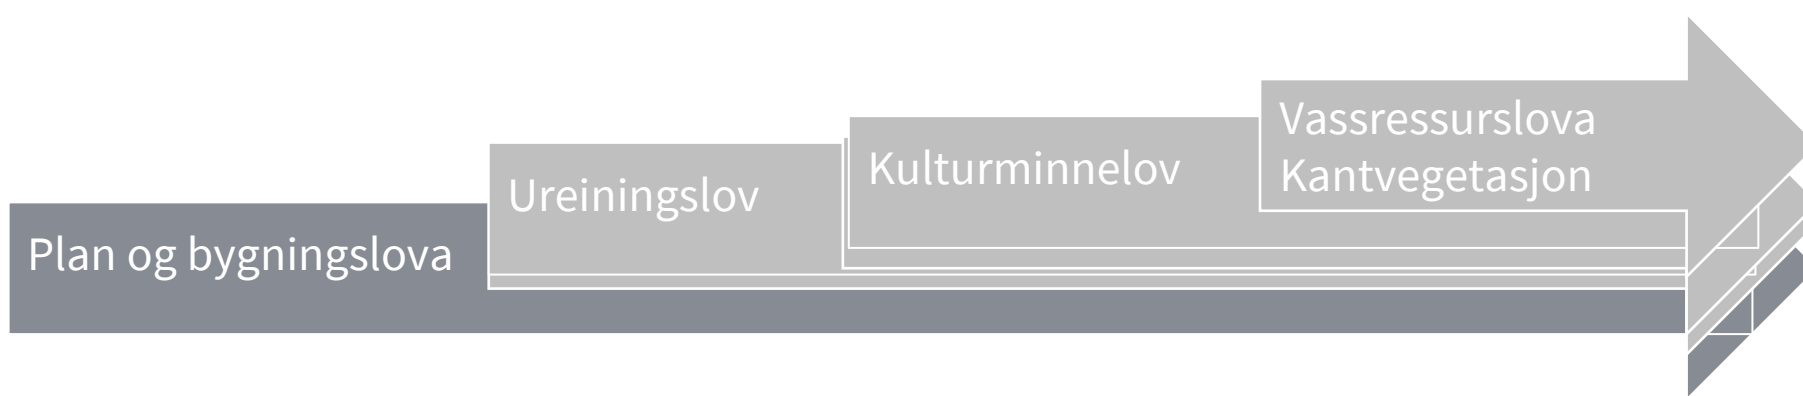

- Plan og bygningslova – Friteken for byggesaksreglane, men må være i samsvar med arealdelen.

- LNF – byggeforbod

Kommunal- og distriktsdepartementet

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2022) s 192


Særregler for konsesjonbehandlede energiltak

«Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven legges det til grunn at sektormyndighetens syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen,»

Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene.

Snubletråd 4

Frå konsesjonsvedtak til byggestart – forenkla prosessbeskrivelse

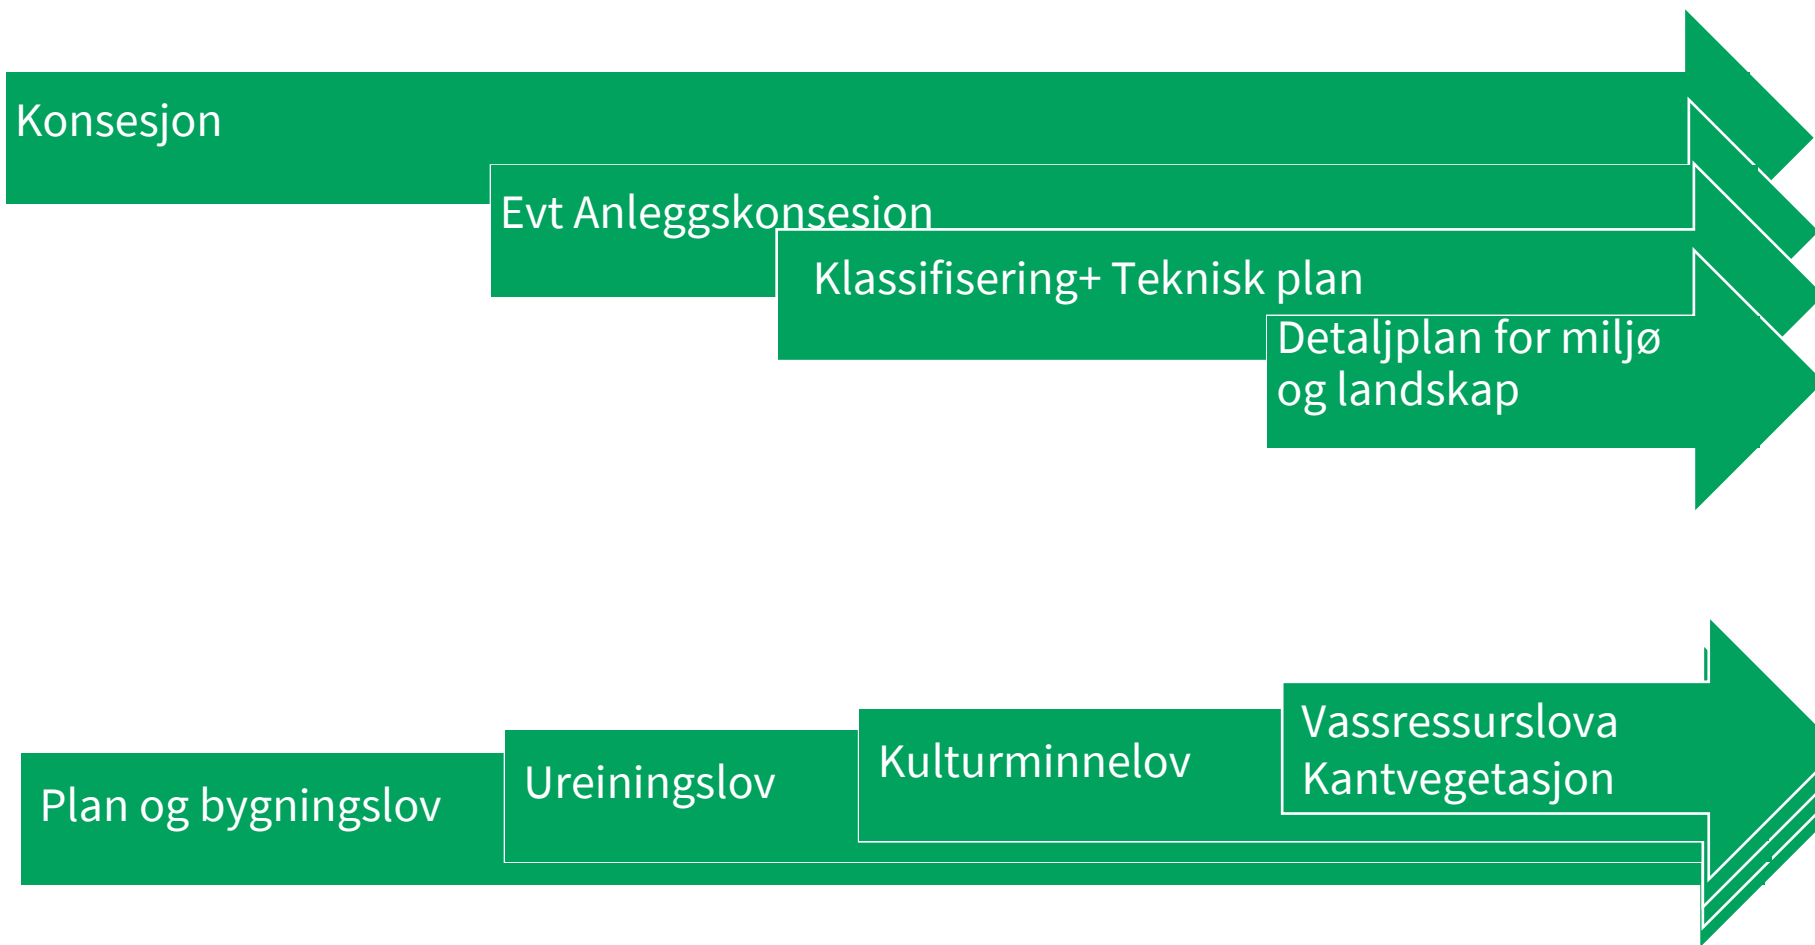

Evt endringar i detaljplan for miljø og landskap

➤ Konesesjonen fastset ytre råmer

- *Søknaden oppgir en maksimal effekt på 5,5 MW. Nøyaktig installert effekt kan justeres ved detaljplan.*
- *Kraftstasjonen skal plasseres i tråd med det som er oppgitt i søknaden, men kan justeres i detaljplan.*
- *Midlertidige og permanente veier skal bygges i tråd med det som er oppgitt i søknaden og i brevet om justeringer av inntaksplassering. Disse kan justeres i forbindelse med detaljplan.*

➤ Detaljplan miljø og landskap

- Endringar i høve konsesjon- utfordrar sakshandsamingstida
- Vert godkjent etter høyring og skal som hovudregel ikkje endrast.
 - Avklar eventuelle behov for endring med saksansvarleg hos miljøtilsynet
 - Sørg for skriftleg dokumentasjon på avklaringar

Dagens stalltips frå miljøtilsynet

NVE godkjente mer enn 150 planer og gjennomførte nærmere 200 kontroller av vannkraftverk i 2024
37 av de godkjente detaljplanene var for nye småkraftverk.

Detaljplan for miljø og landskap

1. Bruk rettleiingsmateriell, faktaark
2. Ta kontakt med Miljøtilsynet tidleg i prosessen
3. Samiske interesser – eigne prosesskrav
4. God plan – unngår unødige rundar
5. Oppfølging byggefase:– inspeksjon etter avslutta byggefase med fokus på særlege vilkår i konsesjonen
 - Minstevassføring
 - Omløpsventil
 - Fiskepassasje

- Pågåande aksjon på minstevassføring - **og det kjem vi til å fortsette med**
- IK-vassdrag – sørg for orden i sysakene

Takk for oppmerksomheita

